Montpellier SupAgro –
Christophe Lesueur
ASC- Hugo Lehoux

Présentation

Décembre 2020

Projet PACTE

SUIVI EVALUATION DE PROJET

EXPOSÉ JOUR 4 : LE DISPOSITIF DE SUIVI ÉVALUATION

l'institut Agro
agriculture • alimentation • environnement
Montpellier SupAgro

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Définition du dispositif de SE

Concevoir un dispositif de SE

Mettre en œuvre un dispositif de SE

Application a votre étude de cas

VIE DU PROJET ET SE

Conception programmation

- Définition, démarche
- Mise en place du dispositif
- Conception d'outils
- Définition d'indicateurs

Vie du projet

- Collecte et alimentation régulières
- Points d'analyse interne
- Traitement des données
- Production de rapports et autres supports
- Évolution du dispositif

Evaluation

- Exploitation des données dans l'évaluation

Fin ou autre cycle

- Réadaptation et révision des outils
- Nouveaux indicateurs

DEMARCHE DE SUIVI

LE DISPOSITIF DE SE

Il est constitué d' une combinaison :

- d'acteurs
- d'outils
- et d'indicateurs

C'est aussi, différentes :

- démarches,
- méthodes
- et outils de suivi


Il a vocation à :

- permettre d'administrer un projet

Mais aussi à mieux comprendre :

- les éléments de contexte,
- les potentialités à exploiter,
- les dynamiques en cours,
- les acteurs impliqués et leurs rôles

SCHÉMATISATION D'UN DISPOSITIF DE SE

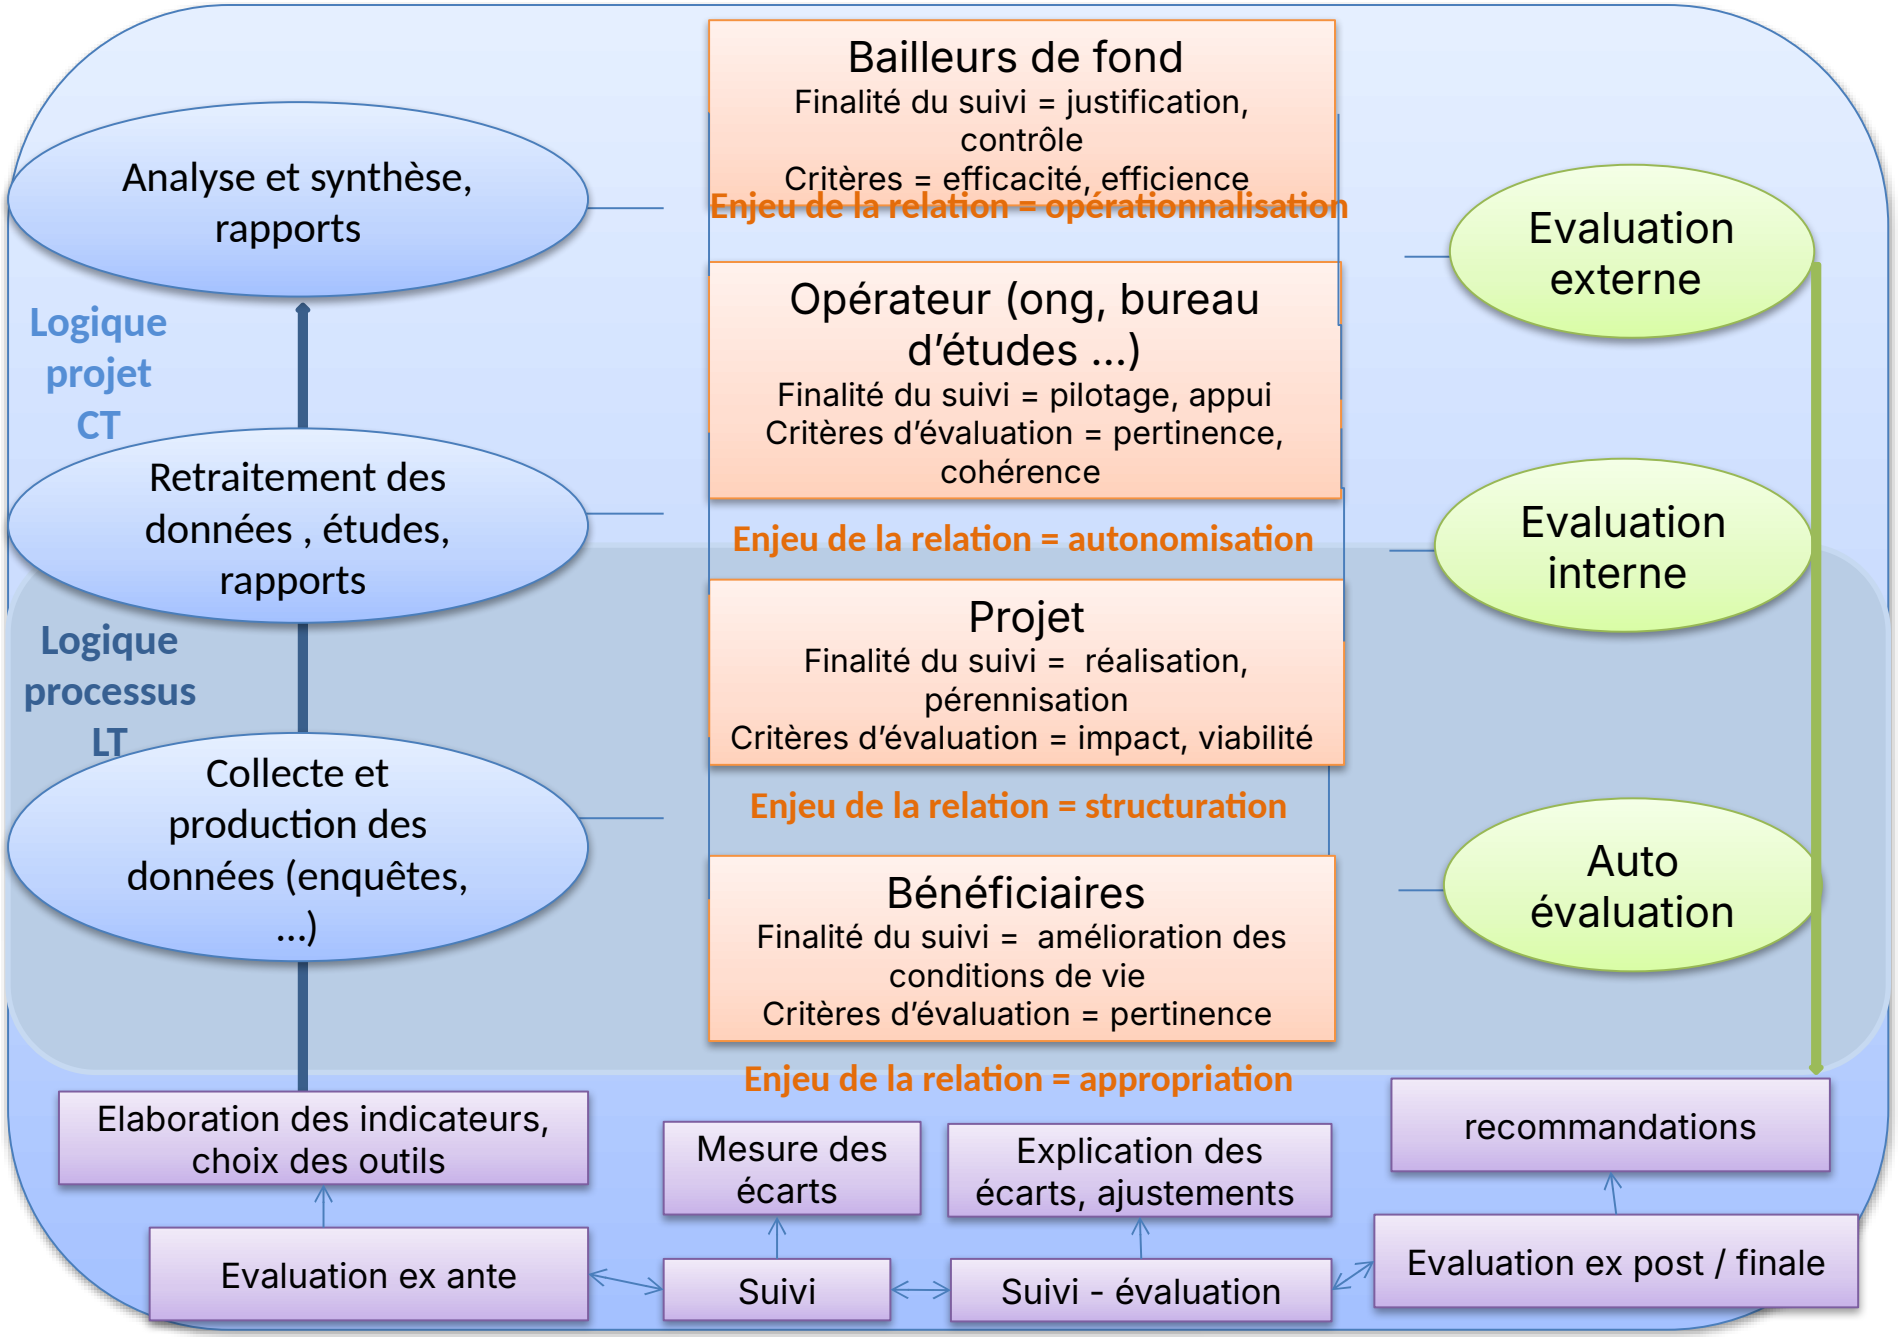

LES OUTILS DU SE

Fiches de suivi (individuelles ou récapitulatives (groupes , village, zone) : Base de la collecte de données qui nécessite ensuite un traitement de l'information. Elles peuvent concerner le suivi de l'exécution (performance) et l'analyse des indicateurs (évolution des prix, coûts ...)

Tableaux de bords : Permet de compiler les données pour comparer et mesurer dans le temps par rapport à des données de références ou autres dans la zone.

Bulletins lettre d'information

Rapports mensuels ou trimestriels

Diagnostics annuels

Prévisions mensuelles, trimestrielles, annuelles

Documents de proposition d'actions

Bilans d'enquêtes légères ou de sondages ...

Et aussi : Missions de terrain, ateliers, tables rondes, comité de pilotage ...

LES INDICATEURS

DÉFINITION :

Un indicateur est un signe objectivement vérifiable, que l'on peut mesurer ou observer pour comparer les objectifs aux réalisations effectives à divers niveaux. Il doit être :

fiable : mesure et interprétation identiques pour tous les utilisateurs ;

spécifique et indépendant des autres : une seule chose mesurée à la fois ;

mesurable et disponible à des coûts et délais acceptables ;

pertinent : se rapporte à l'objectif, et le couvre(temps, espace, contenu

LES INDICATEURS

Les indicateurs de suivi de l'exécution du projet sont élaborés dès la conception du projet (dans le cadre logique)

Ils concernent la mesure de la performance du projet en fonction de la nature des activités et de ses différentes « dimensions » : organisationnelle, sociale, technique, économique, environnementale.

Une fois conçus, renseignés et analysés ils permettent de mesurer la performance du projet (changements ou résultats obtenus grâce aux activités mises en œuvre) et doivent pouvoir évoluer en fonction de cette dernière et des éventuels changements de contexte

LES INDICATEURS

Indicateurs quantitatifs / qualitatifs ：Attention à la tentation de trop d'indicateurs
Difficulté de collecter des indicateurs quanti parfois, les construire lors d'études (consultants ou autres)

Impliquer les groupes locaux dans la production d'indicateurs, mettre en place des réseaux avec les acteurs locaux (administrations, privés ...) pour organiser la recherche et la production d'indicateurs)

Attention à la cohérence selon les composantes de projets (appui Op, appui technique ...)

Les indicateurs qualitatifs sont plus délicats à construire (amélioration des conditions de vies », structuration d'une op »...), pour les construire on les rapproche d'indicateurs quantitatifs on définissant des proxy (exemple du PIB utilisé pour la mesure du « niveau de vie »)

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE SE

Principes / le DSE doit être Léger ;

Concerté ;

ciblé ;

évolutif ;

adapté

Et aussi

L'amélioration continue du projet en constitue la finalité

Implication des acteurs dans la mise au point des outils , dans la pratique du suivi et dans l'analyse de la situation à partir du suivi

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE SE

Organisation du dispositif de SE :

cellule de SE , comité de suivi , chargé de SE , implication de chaque acteur concerné

Mise en œuvre du suivi :

fiches de suivi ,

réalisation d'enquêtes,

collecte d'informations (stats...),

méthodes d'observation sur le terrain,

cahiers de suivi,

réunions de suivi,

animation de groupe ...

RÉSUMÉ SUR LA DÉFINITION D'UN DSE :

Suivre pour qui, pourquoi ? Démarche sous tendant l'élaboration du dispositif pour le projet – mise à plat des intérêts, parfois divergents, des différents intervenants (entre court et long terme, entre le quantitatif et le qualitatif) – concertation sur un objectif convergent de ce suivi pour chacun en incluant les bénéficiaires...

Qui va suivre? Importance du choix des acteurs du suivi et précision des rôles et responsabilités à chaque niveau. Quel appui extérieur serait nécessaire ?

Suivre quoi ? Ciblage et sélection conjointe des aspects qu'il est significatif de suivre...

Suivre par rapport à quoi ? Objectifs prévus et sources de vérification (interne, externe, existence et accès)

Suivre quand ? Importance de la fréquence et de la planification par rapport au projet, aux actions, à l'environnement, aux acteurs. Mesure de ce que cela va impliquer d'un point de vue humain et financier.

Suivre comment ? Mise en place des outils et d'indicateurs réalistes et réalisables en fonction du contexte et des moyens (temps, hommes, finance). Définir les moyens de collecte des informations, ce

EXEMPLE DE TABLEAU POUR ORGANISER LA COLLECTE

Acteur	Défis / changements attendus	Dimension à suivre plus spécifiquement	Comment et où trouver les infos ?	Qui va le faire ?	Quand ? (fréquence de collecte)	Coût ?

EXEMPLE DE TABLEAU DE SYNTHÈSE DU DISPOSITIF DE SUIVI

Résultats attendus	Indicateurs	Données de base	Cibles	Sources de vérification	Risques ou hypothèses	Résultats obtenus	Mesures correctives

SUIVI DES CHANGEMENTS

Quels changement produits ?

Est-ce comme ce que l'on a prévu ?


où se situe-t-on par rapport à la vision ?


Comment améliorer ?

Le suivi des changements complète les données quantitatives / avec les acteurs

Transcrire les chemins de changement en indicateurs (marqueurs de progrès) avec des niveaux d'atteinte (n'a pas bougé, a émis le souhait de bouger, formule des actions, bouge avec le projet, bouge sans le projet)

SUIVI DES CHANGEMENTS

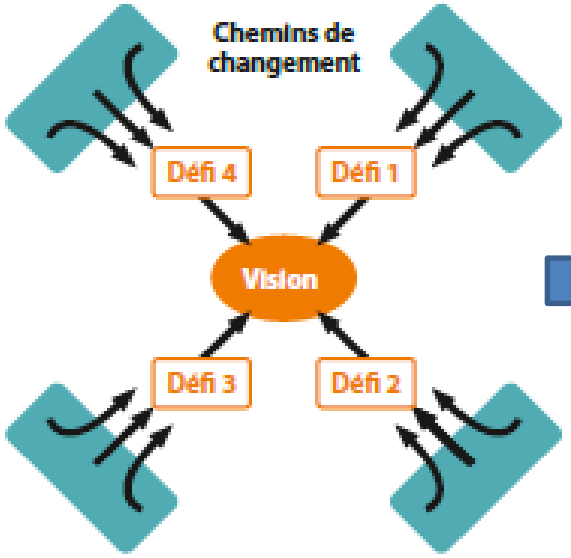

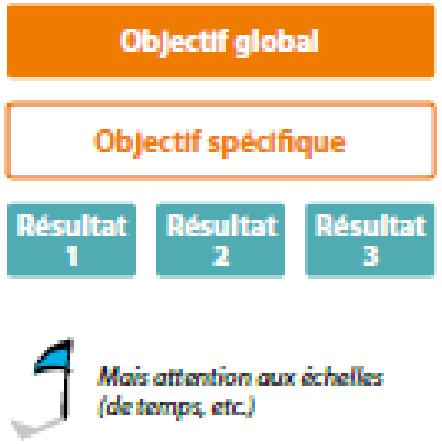

AOC	Cadre logique			
Changements	Obj. spécifique	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3
(…)		X		
			X	
		X		

Tous les changements relatifs au résultat 1

EXEMPLE TABLEAU DE SUIVI
CONSEILLER / PORTEURS DE PROJETS

Nom	Prénom	Projet	Porteur de projet/ en activité	activité lancée	Visite initiale/diagnostic	Visites d'accompagnement	Nombre de visites	MESURES D'IMPACT				Commentaires
								1	2	3	4	

EXEMPLE TABLEAU DE SUIVI DES RÉALISATIONS DU PROJET

Reporting Semestriel – Semestre 1 2016 – Convention n° CZZ2023 02 V

II/ 1er SEMESTRE 2016 : ACTIVITES ET RESULTATS

1. RAPPEL DU CADRE LOGIQUE ET ETAT D'AVANCEMENT SYNTHETIQUE DES ACTIVITES

OBJECTIFS SPECIFIQUES AU 31/07/2017	RESULTATS ATTENDUS AU 31/07/2017	PRINCIPALES ACTIVITES PREVUES AU COURS DU S1 2016	PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES AU COURS DU S1 2016[1]	INDICATEURS DE SUIVI MESURABLES DES ACTIVITES DU S1 2016
OBJECTIF 1	**Résultat 1**			
Créer et développer **deux centres agroalimentaires** en zone rurale, structures hébergeant sur un site aménagé et équipé, un incubateur et une pépinière d'entreprises spécialisés	Dans chaque pays, un centre agroalimentaire a été institutionnalisé et est opérationnel pour accueillir, sur un site aménagé et équipé, les activités de formation, d'accompagnement et l'offre de services mises en place par le projet	**Activité 1.1** Identifier et sécuriser dans chaque pays un site adapté à l'implantation d'activités de formation et de transformation **Activité 1.2** : Viabiliser les terrains (pistes, petites infrastructures, connexion aux réseaux, etc.) **Activité 1.3** : Tester trois premières unités containerisées sur le site du Cameroun **Activité 1.4** : Faire fabriquer, livrer et installer cinq nouvelles unités containerisées, inspirées de la première série **Activité 1.5** : Créer et structurer les entités nécessaires à la mise en œuvre et à la pérennisation des activités du Centre agroalimentaire à l'issue du projet	**Activité 1.1 :** Au Cameroun et en Côte d'Ivoire, l'identification d'un site adapté à l'implantation des deux centres agroalimentaire a été faite dès 2015. **Activité 1.2 :** Au Cameroun, le site est viabilisé depuis 2015. En Côte d'Ivoire, les travaux de viabilisation ont été effectués au cours de ces six derniers mois. Le raccordement aux réseaux électriques et hydrauliques ainsi que les autres travaux de viabilisation ont été entièrement achevés (installation d'un groupe électrogène, dispositif de gestion des eaux usées, etc.). **Activité 1.3 :** Le site du Cameroun est entièrement opérationnel depuis mai 2015 ; il se compose de trois containers aménagés aux normes agroalimentaires et d'un container de stockage des équipements. Il a déjà accueilli 4 promotions d'entrepreneurs pour les parcours d'incubation PMEA. **Activité 1.4 :** La phase de fabrication de 3 unités containerisées destinées au volet ivoirien du projet a été menée à la fin de l'année 2015. Après importation, elles ont été installées sur le site de Tiassalé au cours du mois de mai 2016. Deux containers Reefer ont également été posés et aménagés pour servir de magasins de stockage. L'équipement agroalimentaire acheté en Europe a été acheminé en janvier en Côte d'Ivoire et a été installé. Le centre est opérationnel depuis juin et a permis d'accueillir les premiers entrepreneurs en incubation. **Activité 1.5 :** Un comité stratégique réunissant les différents partenaires du projet s'est tenu en février 2016 afin d'envisager les modalités de création des entités nécessaires à la pérennisation des activités du Centre agroalimentaire du Cameroun. A l'avenir, le Centre pourrait être hébergé par les associations partenaires CED et CIED.	**Indicateurs de résultat :** - 2 conventions de mise à disposition de terrain à titre gracieux signées - 2 sites entièrement viabilisés (Cameroun & Côte d'Ivoire) - 1 centre agroalimentaire en fonctionnement au Cameroun - 1 centre agroalimentaire créé et entièrement opérationnel en Côte d'Ivoire

EXEMPLE TABLEAU DE SUIVI DES RÉALISATIONS DU PROJET

Reporting Semestriel – Semestre 1 2016 – Convention n° CZZ2023 02 V

OBJECTIF 2	Résultat 2			
Renforcer les capacités des **producteurs** en vue de leur ouvrir de nouveaux débouchés grâce à une relation gagnant-gagnant avec les entreprises de transformation	175 producteurs agricoles ont été professionnalisés et sont en capacité de vendre leur production à des entreprises du secteur agroalimentaire	**Activité 2.1 :** Préparer les cycles de formation (élaboration du parcours et des supports de formation-accompagnement des producteurs, prospection et mobilisation des exploitants agricoles)	**Activité 2.1 :** Au Cameroun, les supports de formation ont été améliorés et complétés grâce à l'expérience tirée des premiers cycles de formation organisés en 2015 ; ils ont été repris et adaptés en Côte d'Ivoire pour un public moins alphabétisé. La prospection et la mobilisation de bénéficiaires, menées par les deux formateurs agricoles du projet, ont permis d'inscrire 40 (Cameroun) et 22 (Côte d'Ivoire) agriculteurs aux nouveaux cycles de formation organisés pendant le semestre.	**Indicateurs d'activité :** - 2 cycles de formation organisés au Cameroun au S1 (3 depuis le début du projet), 1 en Côte d'Ivoire (2 depuis le début du projet) - 123 visites individuelles d'accompagnement réalisées au Cameroun au S1 ; 34 en Côte d'Ivoire - 41 visites de mesure d'impact réalisées au Cameroun au S1, 22 en Côte d'Ivoire **Indicateurs de résultat :** - 59 agriculteurs formés au S1 (37 au Cameroun, 22 en Côte d'Ivoire), 84 depuis le début du projet sur 175 ciblés d'ici mi-2017 **Indicateurs d'impact :** - Depuis le début du projet, on observe que 47% des producteurs agricoles ont rationalisé leur usage d'intrants et 64% d'entre eux utilisent des équipements de protection adaptés (EPI)
		Activité 2.2 : Dispenser les cycles de formation spécialisés à 175 producteurs agricoles (par promotions de 25)	**Activité 2.2** : A Njombé, du 1er mars au 12 avril, 19 producteurs de papaye ont suivi le premier cycle de formation technique et de gestion. Le second cycle s'est tenu en mars à Nlohé (30km de Njombé) ; 18 producteurs d'ananas y ont participé. En Côte d'Ivoire, le nouveau cycle de formation organisé au cours du semestre a été orienté sur la gestion de base de l'exploitation et s'est tenu du 26 février au 18 mars ; il a rassemblé 22 agriculteurs.	
		Activité 2.3 : Assurer l'accompagnement des producteurs pendant six mois (visites de suivi individuel sur le lieu de travail de	**Activité 2.3** : Au Cameroun, chaque exploitant agricole ayant suivi au moins un cycle de formation a reçu entre deux et quatre visites d'accompagnement sur son lieu de production, pour lui permettre de mettre en œuvre des changements de pratiques présentés en formation. Grâce à ces évolutions de pratiques, la mise en place d'outils de base de gestion et le travail de mise en réseau	

Exercice :

Construire le dispositif de SE à mettre en place dans votre zone

⇒ Construire un ou plusieurs tableaux de synthèse pour la collecte des données et le la synthèse du dispositif de SE
