Montpellier SupAgro –
Christophe Lesueur
ASC- Hugo Lehoux

Présentation

Juin 2019

Projet PACTE

GESTION DE PROJET

APPLICATION À LA FORMULATION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAUX

TUNISIE

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Introduction et discussion sur les études de cas à choisir en lien avec un plan de développement local

Présentations :

- Gestion axée sur les résultats,
- Répondre à un appel à projet
- cycle de projet,
- méthode du cadre logique

Application de la méthode du cadre logique aux études de cas (reste de la semaine)

PRINCIPES DE LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR)

Simplicité

Stratégie facile à comprendre et mettre en oeuvre, accessible à tous

Participation

Implication des parties prenantes

Utilisation de l'expertise et compétences de tous

Apprentissage par l'action

Pratique ⇒ renforcement capacités, amélioration qualité et résultats

Flexibilité

Adaptation aux changements du contexte et évolution du projet

Responsabilisation

Partage des responsabilités, prise de décision participative

Transparence

Auprès des bailleurs, partenaires et bénéficiaires

Choix indicateurs

RÉPONDRE À UN APPEL À PROJET







Qu'est ce qu'un projet ?

Pourquoi le projet ?

Le projet comment ?

Méthodologie de projet ?

QU'EST CE QU'UN PROJET ?







But d'apporter une réponse à un besoin

- importance de l'étude des besoins

Ensemble d'activités organisées entre elles

- importance de la logique d'intervention

Réalisation des activités dans des délais et avec un budget fixés

- limité par le temps et les ressources

POURQUOI LE PROJET?







Pour passer à l'action avec efficacité

Pour pouvoir apporter une solution réaliste à n'importe quel problème même complexe

Pour passer le l'intuition à la méthode (pas de gestion sans méthodologie)

Pour parler le même langage que les autres porteurs de projets et les financeurs.

LE PROJET COMMENT ?







Structurer un projet

S'attaquer aux causes des problèmes

Définir clairement des objectifs réalistes pour un bénéfice durable

Distinguer les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir

LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET







Pourquoi ? (quels sont les motifs et les objectifs du projet ? A quels besoins répond-il ? Comment les besoins ont-ils été identifiés ? Quelle légitimité pour le demandeur ? Historique du projet ?)

Qui ? (quelles sont les cibles ? Qui gère le projet ?)

Où ? (quels sont les espaces et domaines touchés par le projet ?)

Quoi ? (quelles activités permettent d'atteindre les objectifs ?)

Quand ? (programmation : en combien de temps ?)

Comment ? (Quels moyens ?)

Combien ? (Avec quel budget ? Quels financeurs ?)

ETAPES VERS LA RÉUSSITE D'UN PROJET

Planification

Préparer une proposition de projet

Construire une équipe projet

Apprendre de l'expérience


Lire et relire

préparation

Trouver la documentation appropriée

Trouver le « bon » appel d'offre

Idées à développer



Gestion

Tirer des leçons du projet / capitaliser

Gestion du projet

Signature contrat

Négociation du contrat

Attendre les résultats...

Soumettre l'offre à temps !

Créer un plan de travail

UN MOT SUR LE PARTENARIAT

Créer un partenariat solide requiert



Une idée de projet mobilisatrice

Des besoins réels de synergie et de complémentarité

Une sélection de partenaires pertinents

Un nombre optimum de partenaires, mélangeant les compétences, où chaque partenaire a un rôle bien défini et ou les partenaires partagent de façon équilibrée les activités et bénéfices du projet

UN MOT SUR LE PARTENARIAT

Le travail en partenariat doit être basé sur

Le développement mutuel d'idées et de méthodes

La volonté de produire du changement

La définition de rôles et responsabilités

Le choix d'une institution leader

L'engagement pour collaborer


La volonté de partager des expériences



GESTION DE CYCLE DE PROJET

= phase d'achèvement

= Phase d'analyse

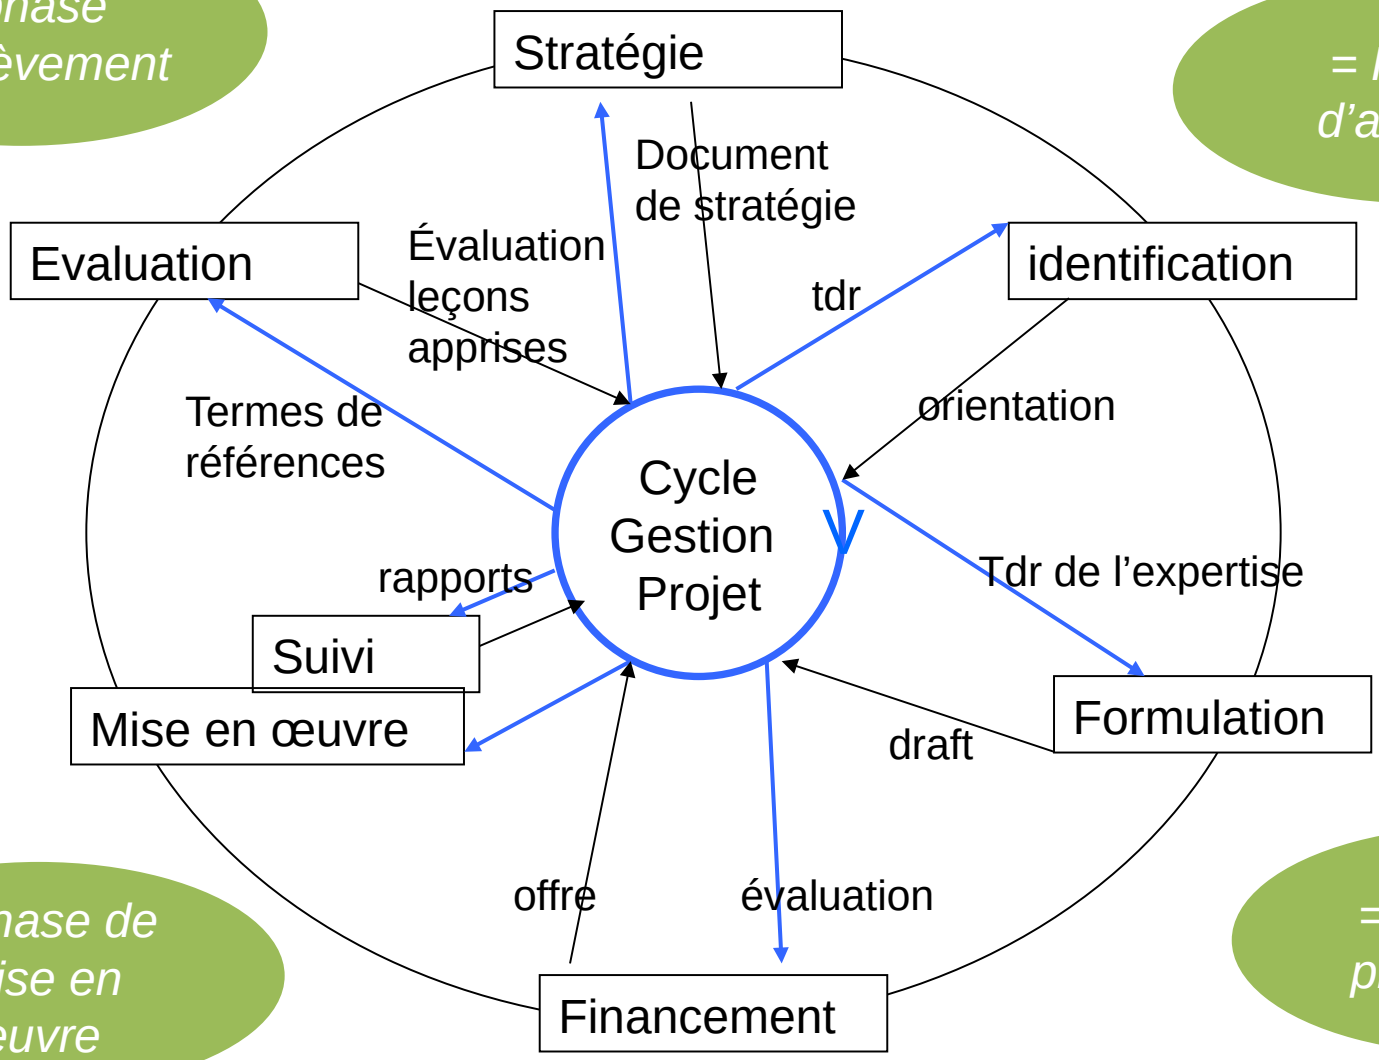

= phase de mise en œuvre

= phase de planification

LE CYCLE DE PROJET

PHASE D'ANALYSE → **PHASE DE PLANIFICATION**

Analyse des parties prenantes – identifier et caractériser les acteurs potentiels principaux, évaluer leur capacité.

Analyse des problèmes – identifier les problèmes clés, les contraintes et opportunités; déterminer les relations de causes à effets.

Analyse des objectifs – trouver des solutions aux problèmes identifiés; identifier les relations entre moyens et fins.

Analyse de la stratégie – identifier les différentes stratégies permettant d'atteindre les solutions et choisir la plus appropriée.

Construire la matrice du cadre logique – définir la structure du projet, tester sa logique & ses risques internes, formuler des indicateurs de succès mesurables.

Calendrier des actions – déterminer la séquence et l'interdépendance des activités; estimer leur durée et attribuer les responsabilités.

Calendrier des ressources – à partir du calendrier des actions, élaborer un échéancier de moyens et un budget.


LE CYCLE DE PROJET

PHASE DE MISE EN OEUVRE → **PHASE D'ACHEVEMENT/EVALUATION**

- Des indicateurs qui fournissent l'information nécessaire pour la gestion du projet (suivi et révision)
- Des hypothèses qui permettent la gestion des risques
- Des plans d'activités mis à jour et liés aux résultats
- Des calendriers de ressources liés aux résultats et des budgets mis à jour.

- Une analyse claire des problèmes et de la situation afin d'évaluer la pertinence du projet.
- Une structure d'objectifs et des indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité et l'impact.
- Un programme d'activité et un calendrier des ressources pour en évaluer l'efficience

LE CADRE LOGIQUE

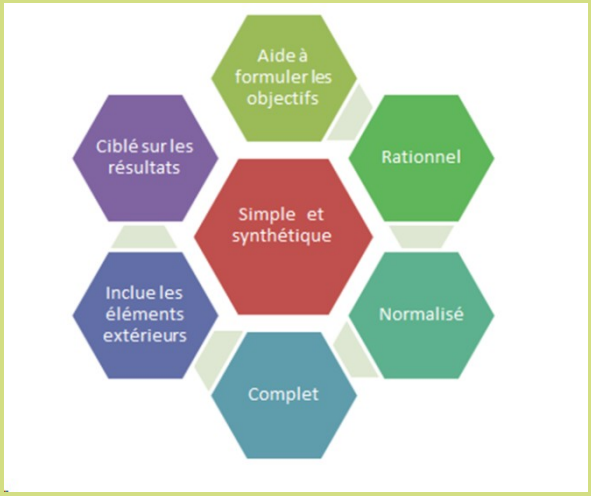

Qu'est ce que c'est ?

- ✓ Une méthode systématique de préparation de projet

Qu'est ce que ca apporte ?

- ✓ une matrice produite à la fin du processus avec une structure adaptée à la conception et la mise en œuvre du projet Pourquoi le faire ?

- Pour quoi l'utiliser ?
  - ✓ cela fournit une image du contexte et de l'objet du projet
  - ✓ Cela présente une architecture des idées du projet en clarifiant objectifs et résultats
  - ✓ Cela présente une description logique claire et brève du projet
  - ✓ Cela aide à identifier les risques potentiels liés à la mise en œuvre du projet
  - ✓ Cela fournit une base utile pour l'évaluation pendant et à la fin du projet

LE CADRE LOGIQUE / LES ÉTAPES

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

Analyse de la situation / contexte

Analyse des parties prenantes

Analyse du problème

Analyse des objectifs


Analyse des alternatives stratégies

Planification des activités

Planification des ressources

ANALYSE DE LA SITUATION / BESOINS



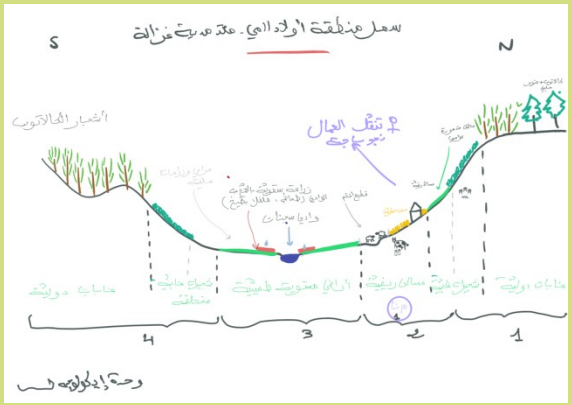

Qu'est ce que c'est ?

- ✓ Une méthode d'analyse systématique pendant la préparation du projet qui définit les besoins d'un groupe (prédéfinition du projet et état des lieux)

Quand le faire ?

- ✓ Idéalement avant d'écrire la proposition
- ✓ Sinon, si c'est nécessaire, en faire une composante du projet et prévoir les coûts nécessaires

Qu'est ce que ca apporte ?

- ✓ Aspects importants à inclure dans les parties « introduction et justification » du projet

Pourquoi le faire ?

- ✓ Cela aide à concevoir et mettre en œuvre la stratégie permettant de traiter correctement les besoins

PHASE D'ANALYSE

ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

- Qui? Tout groupe de personnes qui a un intérêt/ rôle dans la résolution des problèmes identifiés et la recherche de solutions pertinentes.

- On distingue :
  - les parties prenantes primaires directement concernées: publics cibles ou bénéficiaires
  - Les parties prenantes secondaires indirectement touchées
  - les parties prenantes clés, incontournables pour le processus de changement

PHASE D'ANALYSE


ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

- Questions clés
  - Qui sont les parties prenantes?
  - Quel est leur profil?
  - Quels sont les intérêts en jeu?
  - Quelles sont les relations entre chaque partie prenante?
  - Qui est prêt/opposé au changement?
  - Quels bénéfices en seront retirés par les unes et par les autres?
- Outils complémentaires pour l'analyse des parties prenantes:
  - Analyse SWOT
  - Diagrammes de Venn
  - Graphiques en toile d'araignée
  - Analyse systémique

PHASE D'ANALYSE

ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

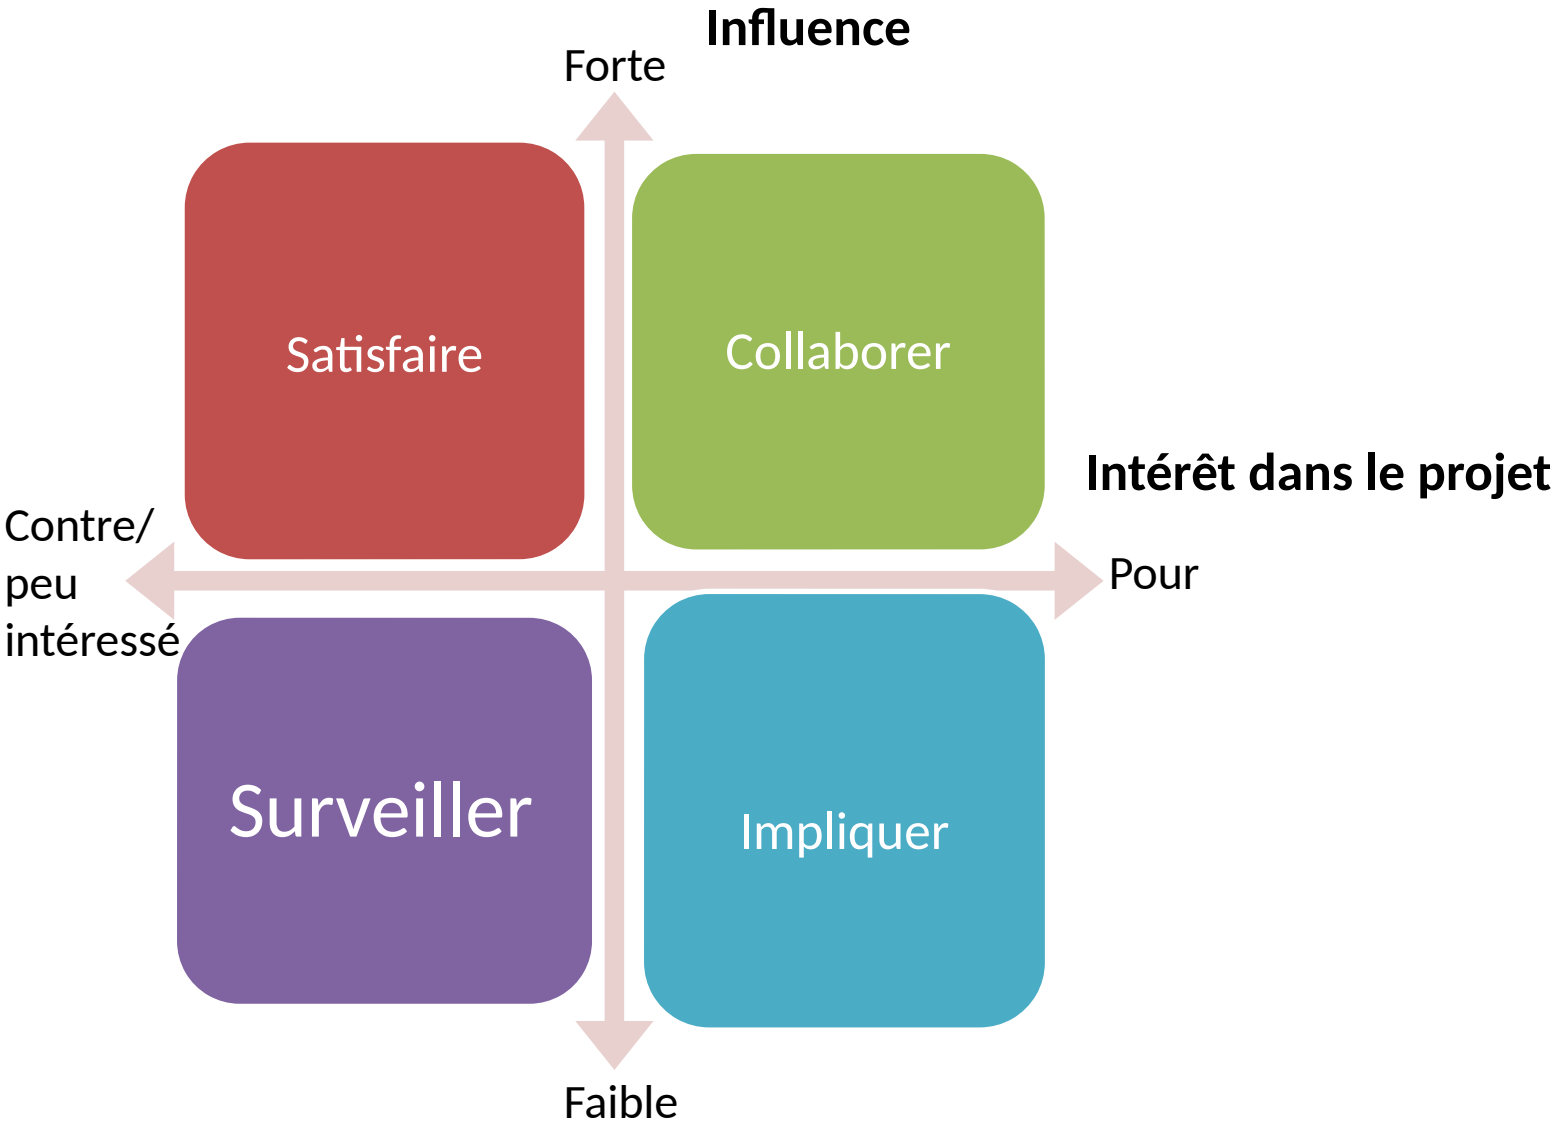

ANALYSE DES PROBLÈMES


	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

- Pourquoi? L' « arbre à problèmes » montre les effets d'un problème ainsi que ses causes et permet d'identifier les vrais problèmes de fond

- Les étapes principales sont:
  - identifier un ou deux problème(s) de base (initiaux) qui affecte(nt) le(s) groupe(s) cible(s)
  - identifier les problèmes/ contraintes associés
  - analyser et identifier les relations de causes à effets et créer une première esquisse d'arbre à problème.
  - vérifier la logique de causalité


PHASE D'ANALYSE

L'arbre à problèmes aide à établir les relations de causes à effets entre les problèmes

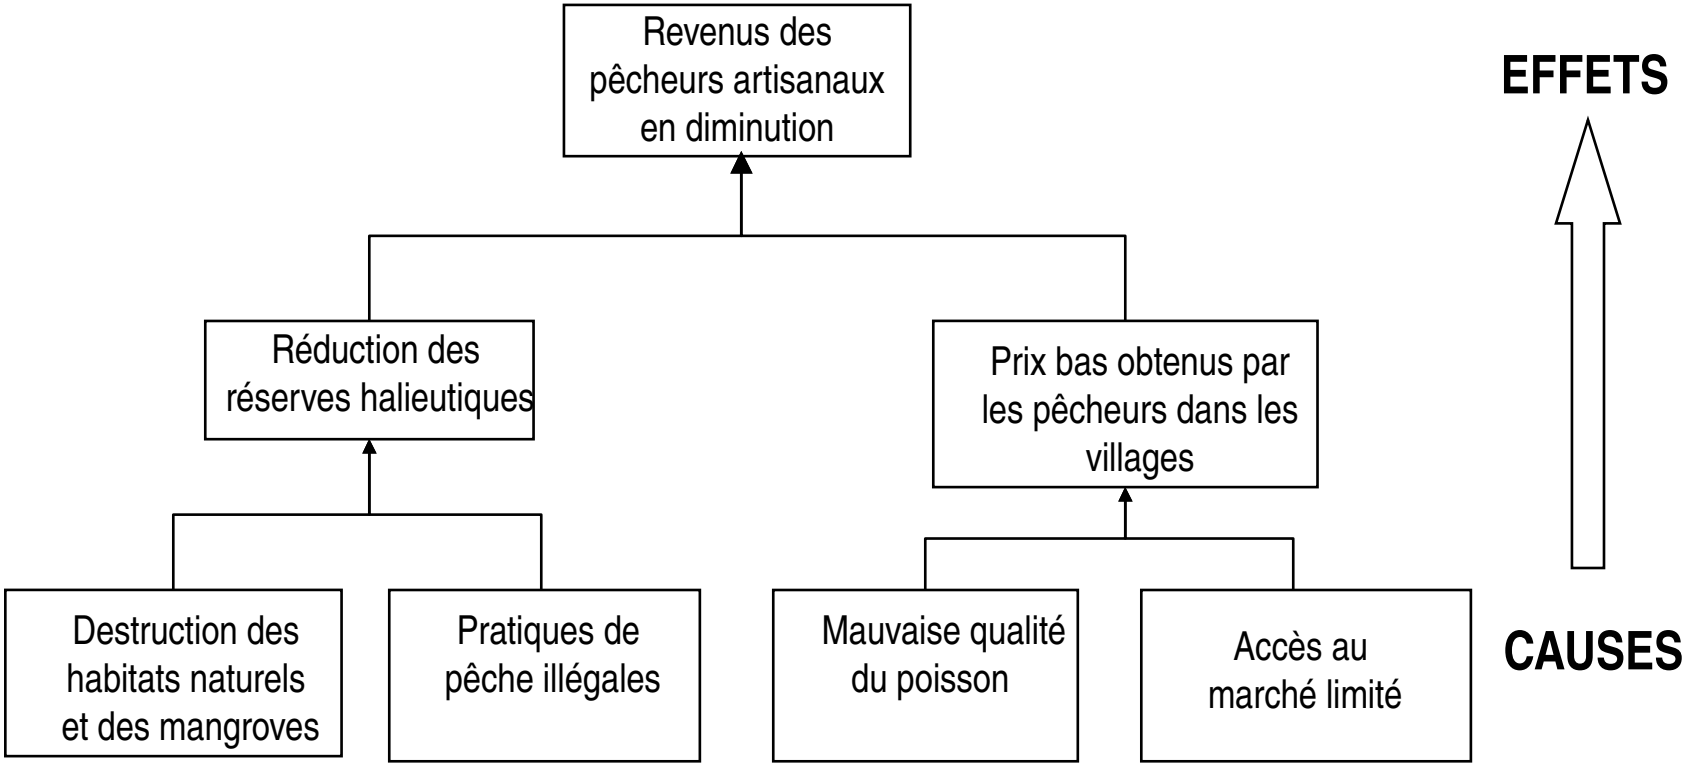

ANALYSE DES OBJECTIFS

Convertir les problèmes en 'réalisations positives' en identifiant la relation moyens - fin

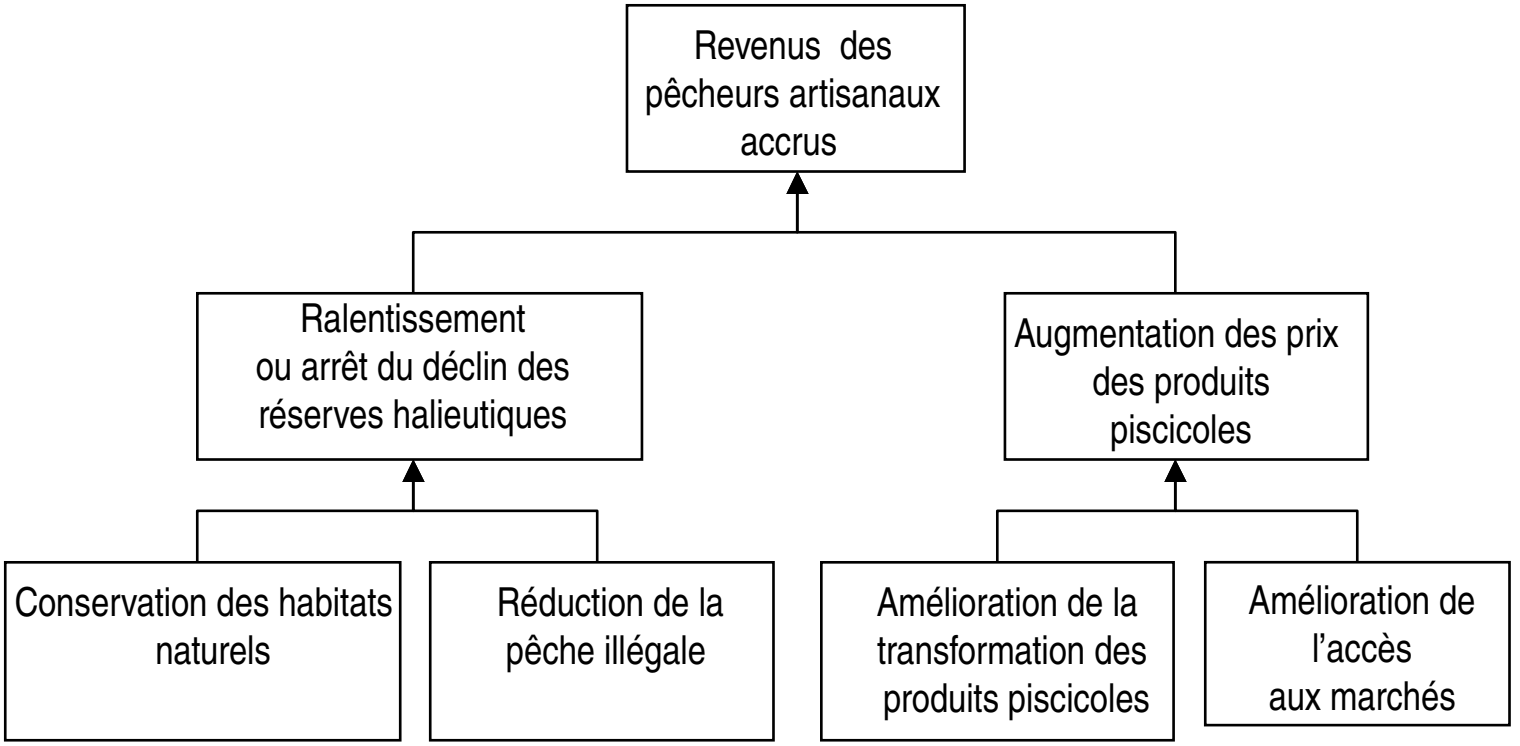

ANALYSE DES STRATÉGIES


	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

- Consiste à
  - confronter l'ensemble des solutions répertoriées à votre réalité et à votre contexte.
  - Quelle est votre plus-value ? Quels sont vos moyens ? Quelle complémentarité avec d'autres organisations déjà actives sur les champs identifiés ?
- choisir une stratégie appropriée pour la mise en œuvre du projet en gardant en tête l'ensemble des critères d'évaluation : **Pertinence, Cohérence, Efficacité, Efficience, Impact, Durabilité**

PHASE D'ANALYSE

Stratégie … exemple


Hors projet (éléments qui devront être pris en compte dans les hypothèses et risques …)

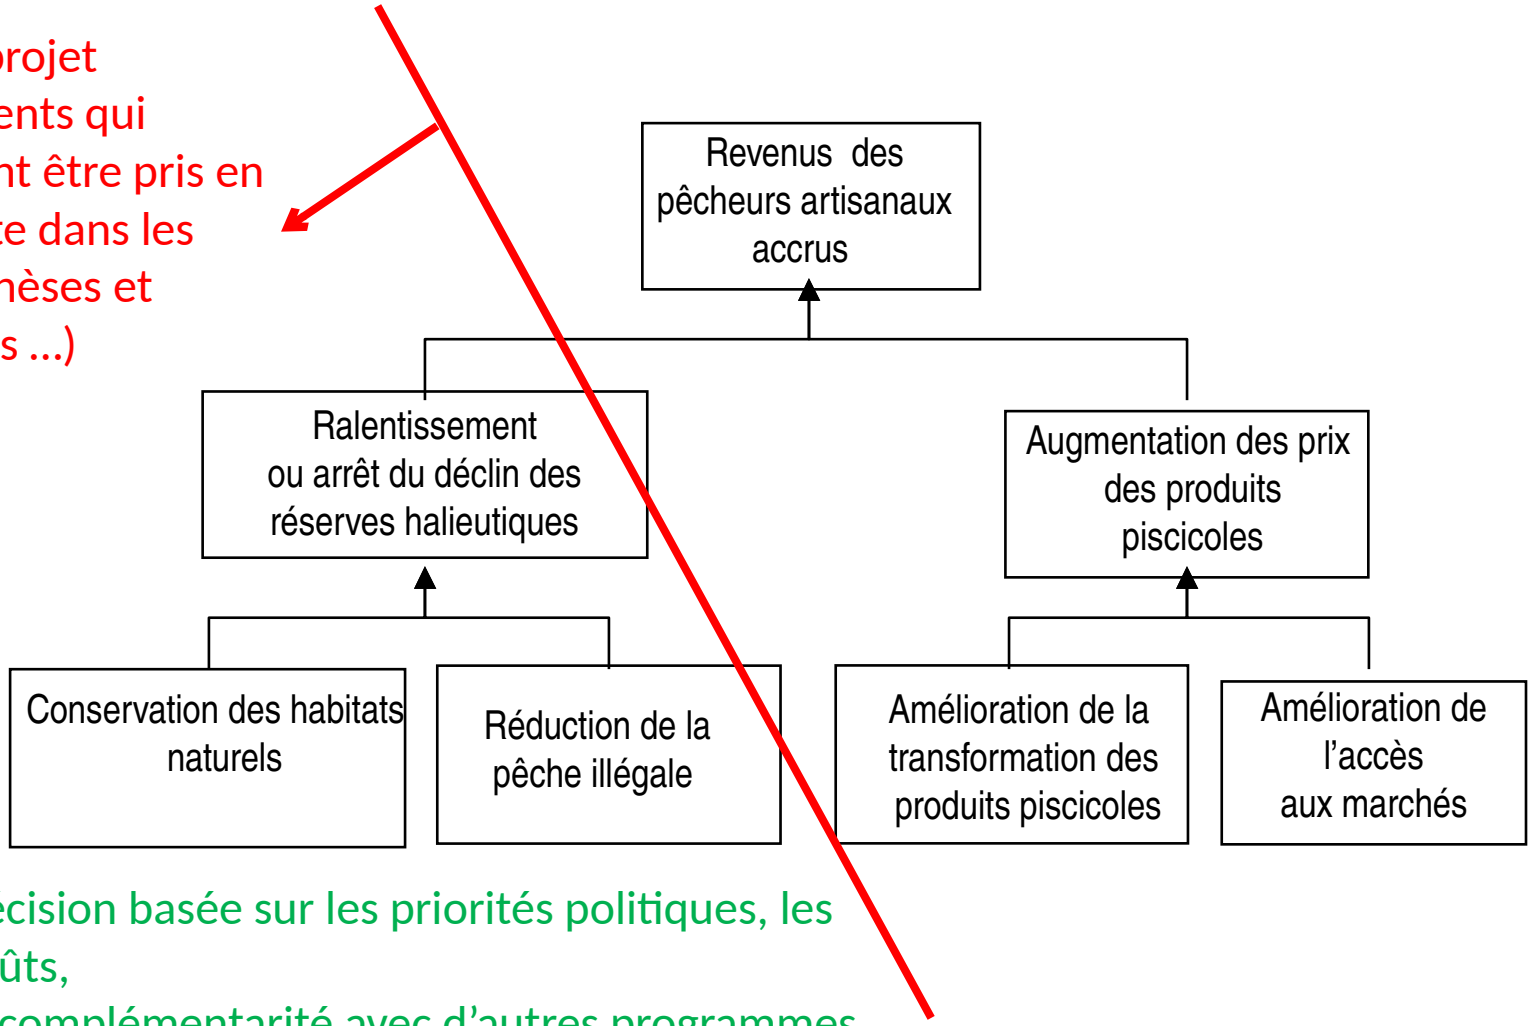

Décision basée sur les priorités politiques, les coûts,
la complémentarité avec d'autres programmes d'aide, etc.

PHASE D'ANALYSE

LE CADRE LOGIQUE / PLANIFICATION

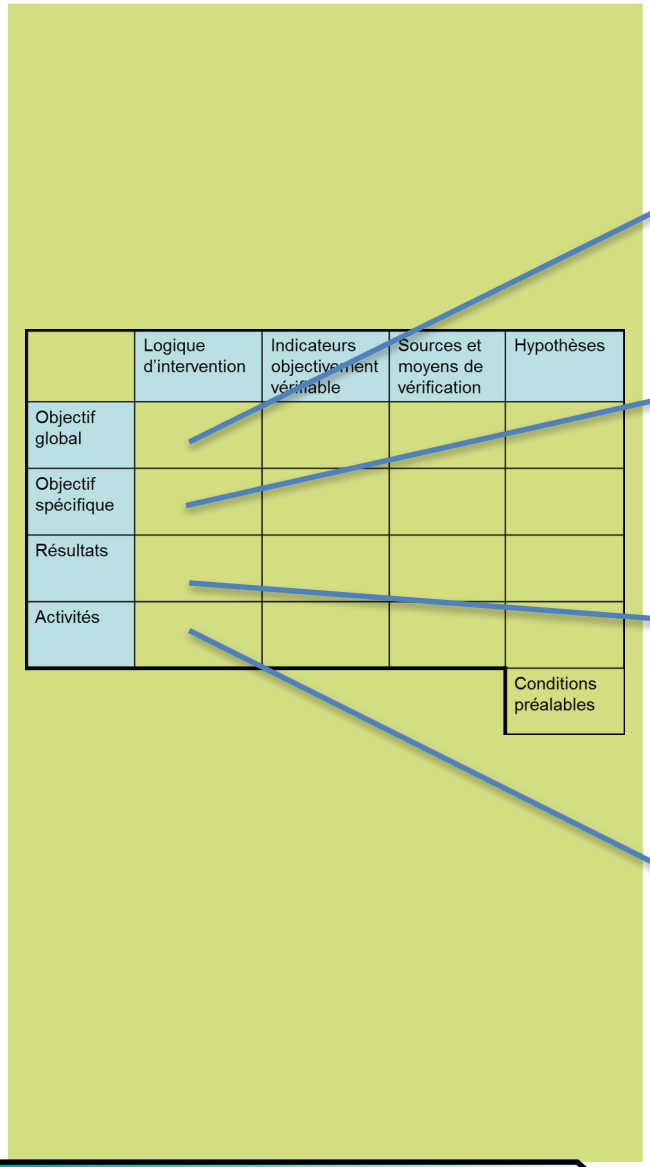


Raison d'être du projet
A quoi le projet doit il contribuer à plus ou moins long terme ? Pourquoi le projet est il si important ?

Cœur du projet
Quels sont les changements importants attendus pour le groupe cible à l'issue de ce projet ?

Résultats réels
Quels sont les services et produits que doit générer le projet pour atteindre l'objectif spécifique ?


Ensemble des actions à mettre en œuvre
Quelles sont toutes les actions à mettre en œuvre pour atteindre les résultats souhaités ?

PLANIFICATION / LOGIQUE VERTICALE

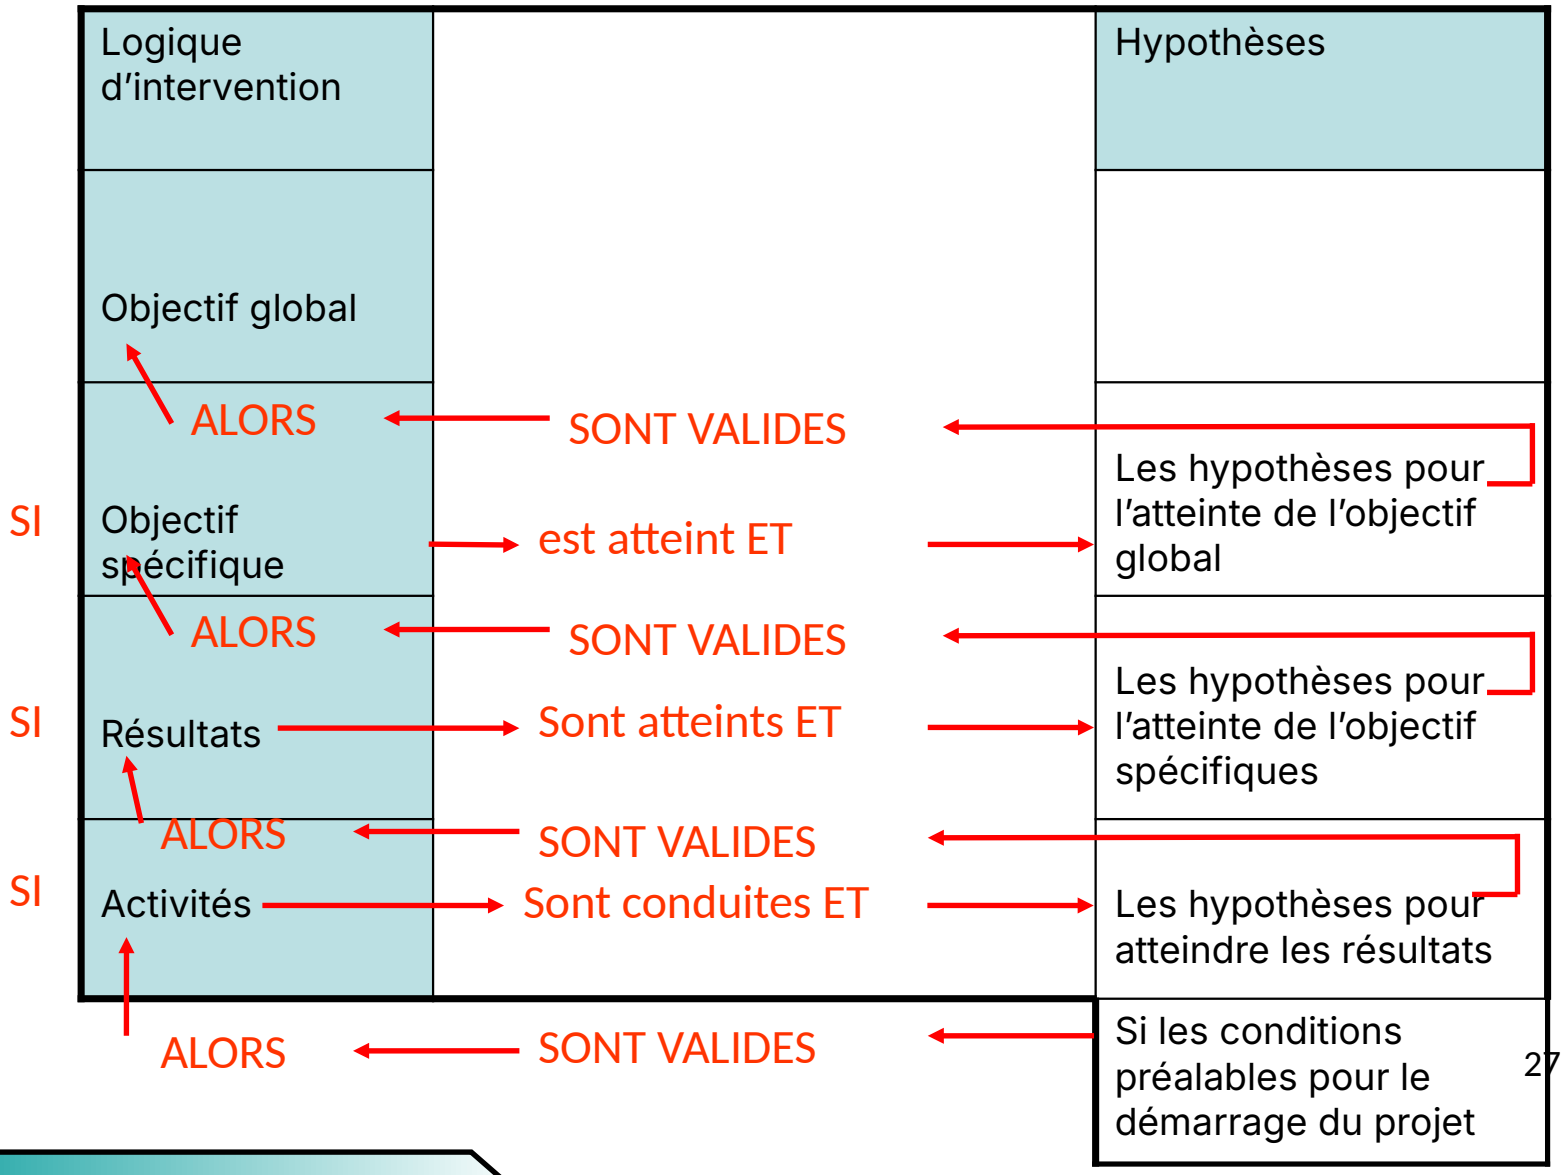

PLANIFICATION / LOGIQUE VERTICALE

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothès
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

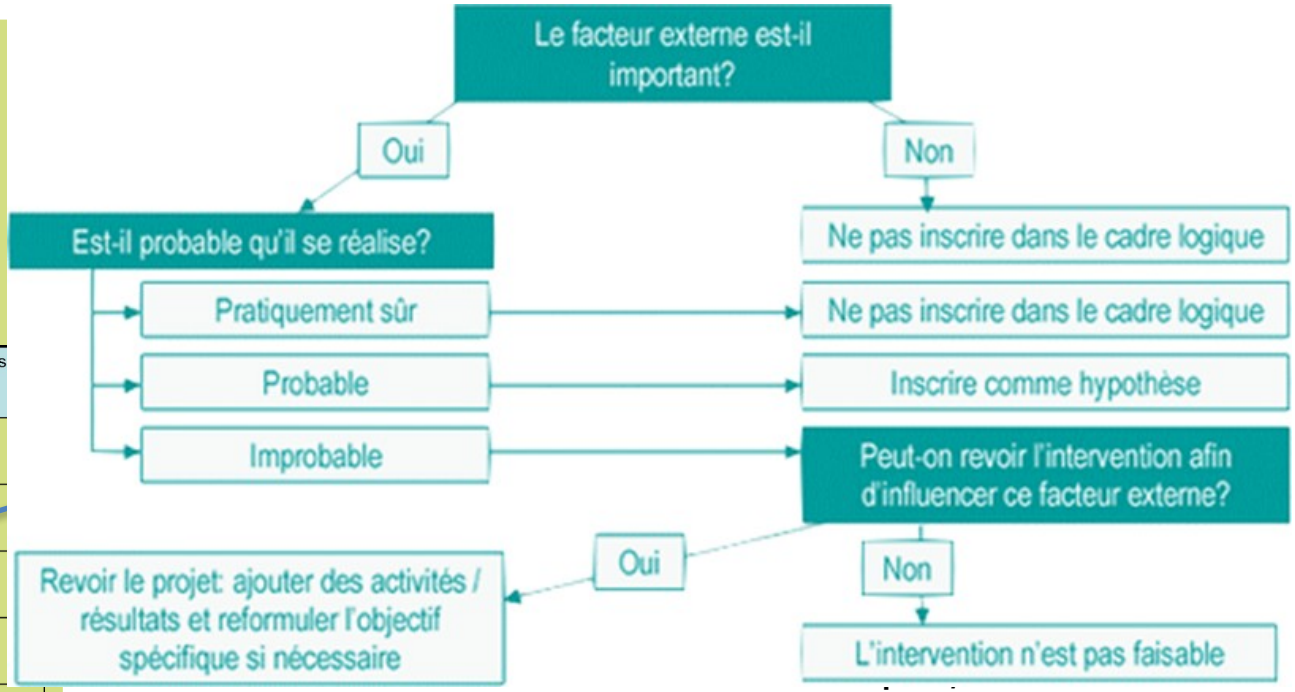

internes au projet, et identifient les hypothèses auxquelles le projet est confronté.

Conditions préalables

Identifier d'importantes conditions préalables à vos activités. Ces conditions ne relèvent pas de votre contrôle et doivent nécessairement être remplies pour mener à bien les activités prévues; ex : promulgation de lois avant le démarrage du projet.

Le risque est dit externe si le groupe n'a pas d'influence directe sur lui.

Le risque est dit interne si le groupe a des possibilités de contrôle et d'actions au sein même du projet.

EXEMPLE DU PNPER - TOGO

Logique d'intervention	Hypothèses
Objectif global Contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural Développer de l'entrepreneuriat rural, notamment pour les jeunes et les femmes	
Objectifs spécifiques 1. Augmenter très sensiblement les initiatives crédibles pour la création de MPER (jeunes et femmes) 2. Opérationnaliser des MPER durables et viables	Environnement juridique et financier des affaires favorable
Résultats 1.1- Un service régionalisé d'appui en ingénierie de formation accompagne les dispositifs de formation et de conseil 1.2- L'offre de formation professionnelle et d'alphabétisation fonctionnelle en région est renforcée 1.3- Des primo-entrepreneurs bénéficiaires du "coup d'pouce" à l'installation	Réticences des IFR à financer des projets du secteur agricole


EXEMPLE DU PNPER - TOGO

Logique d'intervention	Hypothèses et risques
Objectif global Contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural Développer de l'entrepreneuriat rural, notamment pour les jeunes et les femmes	
Objectifs spécifiques 1. Augmenter très sensiblement les initiatives crédibles pour la création de MPER (jeunes et femmes) 2. Opérationnaliser des MPER durables et viables	Environnement juridique et financier des affaires favorable
Résultats 2.1- Un réseau de prestataires de services non financiers compétents, est opérationnel 2.2- Des MPER en amont et en aval de la production agricole sont créées ou consolidées et viabilisées 2.3- La productivité et les standards de qualité des produits des MPER sont améliorés 2.4- Les MPER ont un accès durable à des services financiers	Hypothèses Volonté des prestataires de services de répondre aux besoins des micro et petites entreprises Les questions foncières ne constituent pas une entrave à l'installation des micro et petites entreprises Risques Insuffisance de prestataires de services compétents dans les régions ...

PHASE DE PLANIFICATION

de proje

PLANIFICATION / LOGIQUE HORIZONTALE

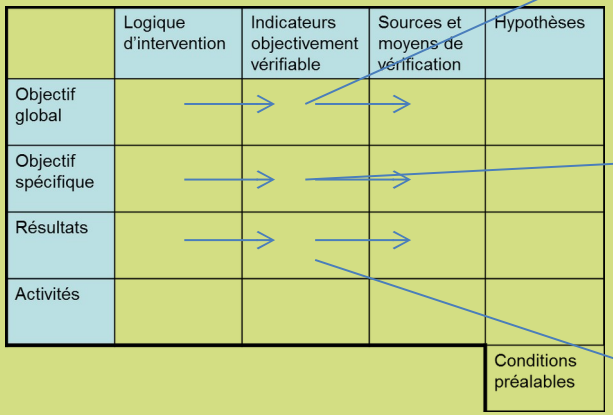

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

Indicateurs d'impact

Indicateurs de résultats (outcome)

Indicateurs de réalisations directes (Outputs)

Pour chaque niveau de résultats, il est essentiel de pouvoir les évaluer, afin de vérifier du déroulement à la pertinence du projet. Les indicateurs doivent répondre à la question : « comment savoir si ce qui a été pensé et planifié a réellement été atteint… comment vérifier et démontrer la réussite du projet ? »

Les indicateurs doivent être indépendants, chacun se rapportant à un seul objectif de la logique d'intervention. Par exemple les indicateurs au niveau d'un résultat ne doivent pas être le résumé de ce qui a été dit au niveau de l'activité mais doit décrire les conséquences mesurables de la mise en œuvre de l'activité.

Les indicateurs doivent être SMART (spécifique, mesurable, de coût acceptable, répondant aux attentes et limités dans le temps)

EXEMPLE DU PNPER - TOGO

Logique d'intervention	IOV	Sources de vérification
Objectif global Contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural Développer l'entrepreneuriat rural, notamment pour les jeunes et les femmes	- Augmentation de l'indice d'accumulation des biens des ménages cibles - Réduction de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans	- Enquête SYGRI - Suivi-évaluation PNIASA, SCAPE - Statistiques nationales et enquêtes socio-économiques d'impact
Objectifs spécifiques 1. Augmenter très sensiblement les initiatives crédibles pour la création de MPER (jeunes et femmes) 2. Opérationnaliser des MPER durables et viables	- Au moins 65% des MPER crées/consolidées sont fonctionnelles 3 ans après l'intervention du Projet. - Au moins 65% des MPER promues/consolidées ont vu leurs du chiffre d'affaire augmenter de 50% au moins - 6200 emplois directs créés par les MPER promues/consolidées (par type/sexe et par secteur) - 150.000 personnes ont bénéficié des actions du Projet dont x jeunes et y femmes	- Rapport d'évaluation à mi-parcours - Rapport d'achèvement et d'évaluation finale du Projet

PHASE DE PLANIFICATION

EXEMPLE DU PNPER - TOGO


Logique d'intervention	IOV	Sources de vérification
Résultats 1.1- Un service régionalisé d'appui en ingénierie de formation accompagne les dispositifs de formation et de conseil 1.2- L'offre de formation professionnelle et d'alphabétisation fonctionnelle en région est renforcée 1.3- Des primo-entrepreneurs bénéficiaires du "coup d'pouce" à l'installation	- Nbre d'institutions de formation et conseil mises en réseau au sein des centres de ressources - Nbre de MPER formées dans les centres de formation (primo et établies) - Nbre de primo-entrepreneurs encadrés ayant bénéficié de l'opération "coup d'pouce installation"	- Rapports d'activités et de S-E du projet - Rapports de supervision - Enquêtes sur centres de ressources - Rapports de formation - Registres des membres des IFR partenaires - Rapports des comité de crédit - Rapports des structures
2.1- Un réseau de prestataires de services non financiers compétents, est opérationnel 2.2- Des MPER en amont et en aval de la production agricole sont créées ou consolidées et viabilisées 2.3- La productivité et les standards de qualité des produits des MPER sont améliorés 2.4- Les MPER ont un accès durable	- Nbre de plateformes de services créées et fonctionnelles - Nbre de MPER créées (par type, secteur d'activité et genre) - Evolution des volumes de produits des MPER commercialisés (par type et secteur d'activité) - Nbre de SFD offrant des services aux MPER	- Rapports d'activités du Projet et des prestataires de service - Rapport de S-E du Projet - Rapports de supervision - Enquêtes sur échantillon MPER - Reporting des IFR partenaires

PHASE DE PLANIFICATION

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DÉTAILLÉE

	Logique d'intervention	ndicateurs objectivemer vérifiables	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectifs généraux	*Quel sont les objectifs généraux auxquels l'action va contribuer ?*	*Quels sont les indicateur liés à ces objectifs génér*	*Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs?*	
Objectif spécifique	*Quel objectif spécifique l'action doit-elle atteindre comme contribution aux objectifs*	*Quels indicateurs montre en détail, que l'objectif de l'action est atteint ?*	*Quelles sources d'inform existent et peuvent être rassemblées ? Quelles méthodes pour obtenir ces informations ?*	*Quels facteurs et conditions ho responsabilité du Bénéficiaire sont-elles nécessaires pour at objectif ? (Conditions externes Quels sont les risques à prendre en considération ?*
Résultats attendus	*Les résultats sont les réalisations permettre l'obtention de l'objectif Quels sont les résultats attendus (Numérotez ces résultats)*	*Quels indicateurs permet de vérifier et de mesurer l'action atteint les résulta attendus ?*	*Quelles sont les source d'information pour ces indicateurs ?*	*Quels conditions externes doiv être réalisées pour obtenir les attendus dans le temps escom*
Activités à développ	*Quelles sont les activités-clefs à en oeuvre, et dans quel ordre, afi produire les résultats attendus ? (Groupez les activités par résultat*	***Moyens :*** *Quels moyens sont requ pour mettre en oeuvre ce activités, par exemple pe matériel, formation, étud fournitures, installations opérationnelles, etc. ?*	*Quelles sont les source d'information sur le déro de l'action ?* ***Coûts*** *Quels sont les coûts de leur nature ? (Détail dar budget de l'action)*	*Quelles pré-conditions sont re avant que l'action commence Quelles conditions hors du cor direct du Bénéficiaire doivent é réalisées pour la mise en oeuv des activités prévues ?*

PLANIFICATION DES RESSOURCES

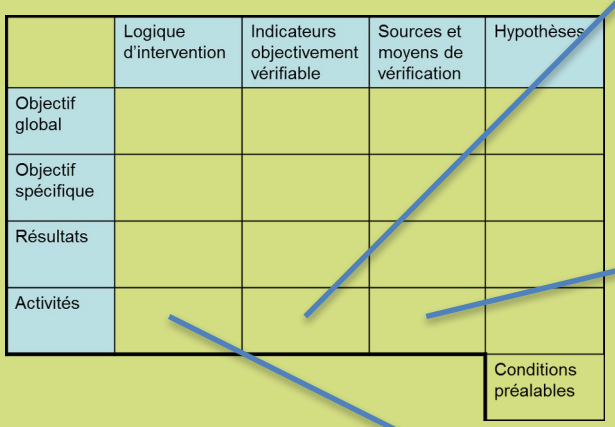

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiable	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif global				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités				
				Conditions préalables

Moyens :
Quels moyens sont requis pour mettre en œuvre ces activités, par exemple personnel, matériel, formation, études, fournitures, installations opérationnelles, etc. ?

Coûts
Quels sont les coûts de l'action ?
leur nature ? (Détail dans le budget de l'action)

Ensemble des actions à mettre en œuvre
Quelles sont toutes les actions à mettre en œuvre pour atteindre les résultats souhaités ?

PLANIFICATION DES RESSOURCES / DIAGRAMME DE GANTT



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Table des tâches						
3	Tâches	Assignée à	Début	Fin	Jours	Statut	
4	Organiser la réunion de démarrage	Alexandre	2-sept.	3-sept.	1	Achevé	
5	S'accorder sur les objectifs	Frank	3-sept.	7-sept.	4	Achevé	
6	Demandes détaillées	Jacques	7-sept.	12-sept.	5	Achevé	
7	Demandes d'équipement	Jacques	9-sept.	11-sept.	2	En retard	
8	Plan final des ressources	Jacques	11-sept.	15-sept.	4	En cours	
9	Personnel	Alex	16-sept.	17-sept.	1	En cours	
10	Demandes techniques	Frank	17-sept.	21-sept.	4	Non commencé	
11	Test	Carinne	24-sept.	2-oct.	8	Non commencé	
12	Développement achevé	Jacques	2-oct.	5-oct.	3	Non commencé	
13	Configuration du matériel	Alex	5-oct.	7-oct.	2	Non commencé	
14	Test du système	Carinne	6-oct.	9-oct.	3	Non commencé	
15	Lancement		9-oct.	10-oct.	1		
16							
17							
18							

Construire un tableau avec au minimum :

- La liste des activités
- Attribuer une durée de l'action, une date de début et une date de fin
- Affecter les ressources / responsabilités

PLANIFICATION DES RESSOURCES / BUDGET

	Rubriques			
Act	inv	rh	trav	…
A1				
A2				


	Année 1			…
rub	CU	NB	Tot	…
inv				
rh				
…				

Liste des activités / workpackages
A1.1
A1.2
…
A2.1 …

Liste des rubriques budgétaires du bailleurs :
Investissements
Ressources humaines
Voyages
Fonctionnement
…

PHASE DE PLANIFICATION

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

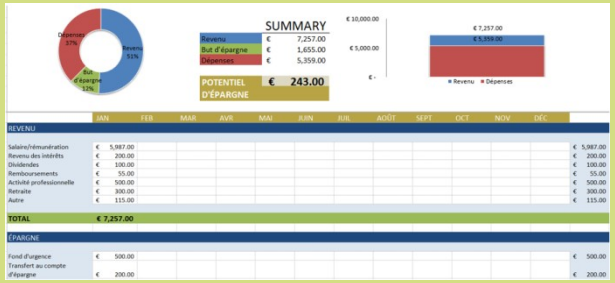




Suivi financier


- Attribuer chaque dépense à l'activité concernée
- Calculer le taux d'exécution par composante / workpackage / rubrique … en fonction des exigences du bailleurs pour le reporting !
- Utilisation d'un outil excel simple (cf. fichier dans le drive)

EVALUATION

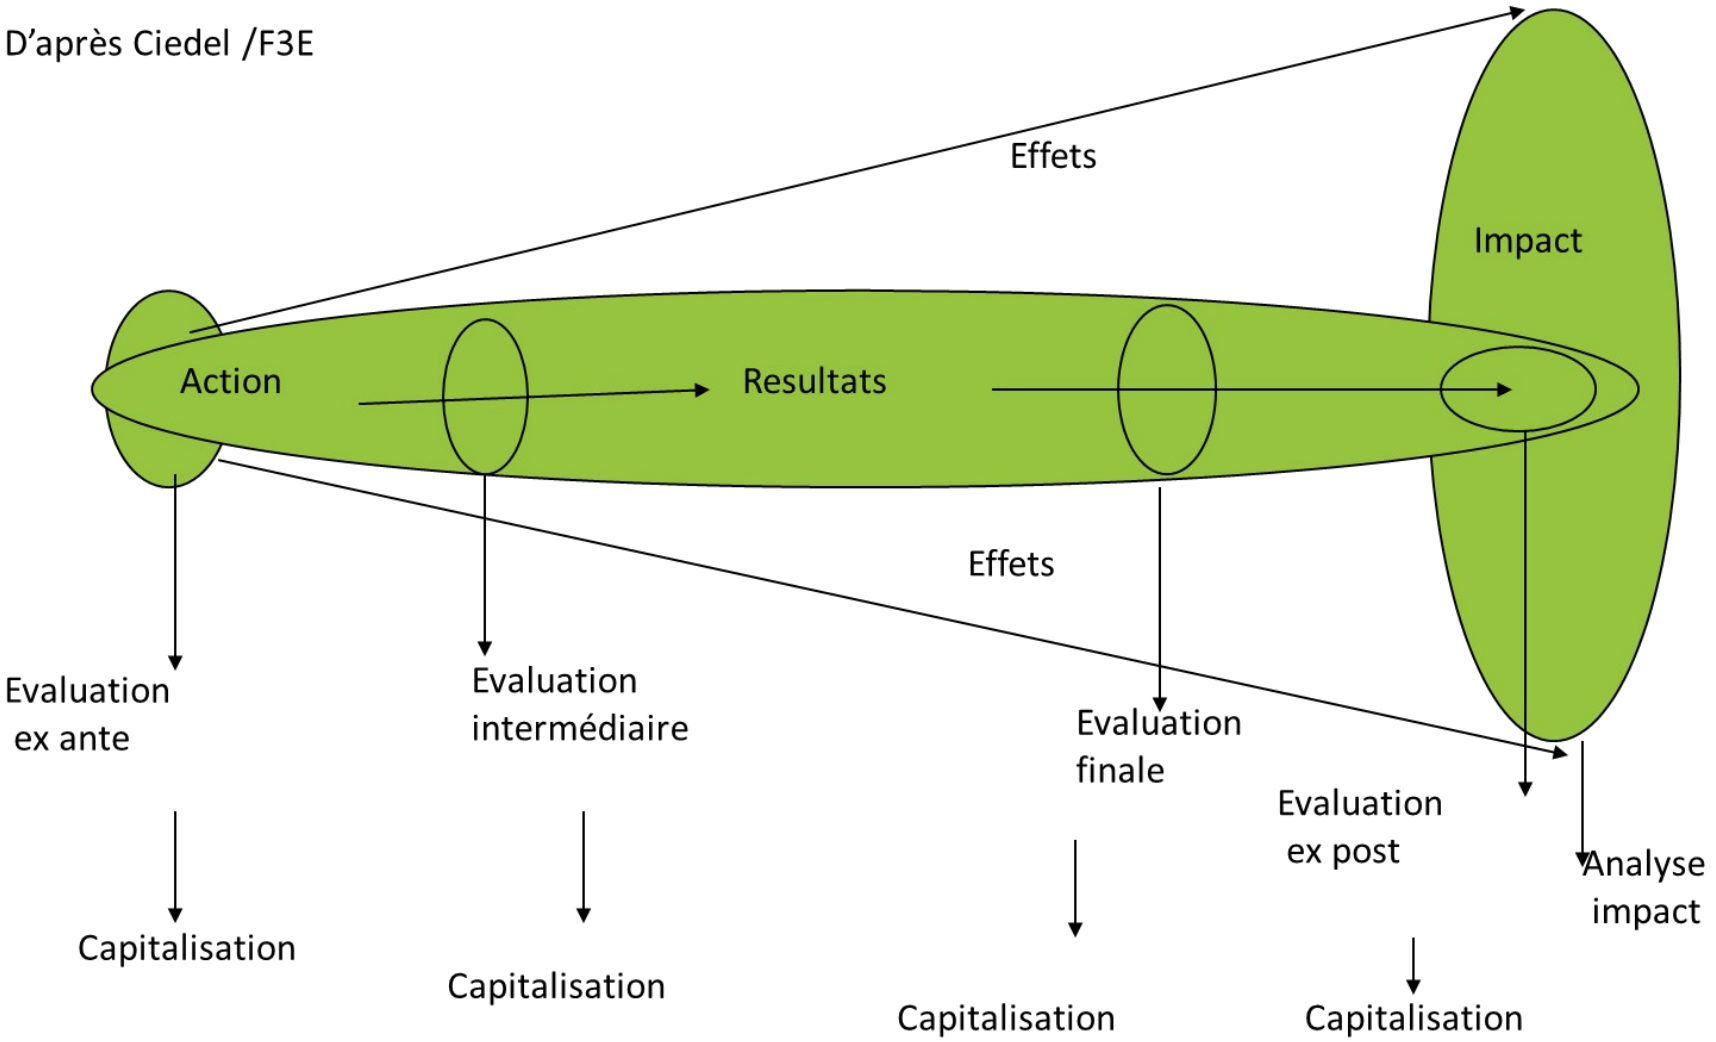

PHASE D'ACHEVEMENT

EVALUATION

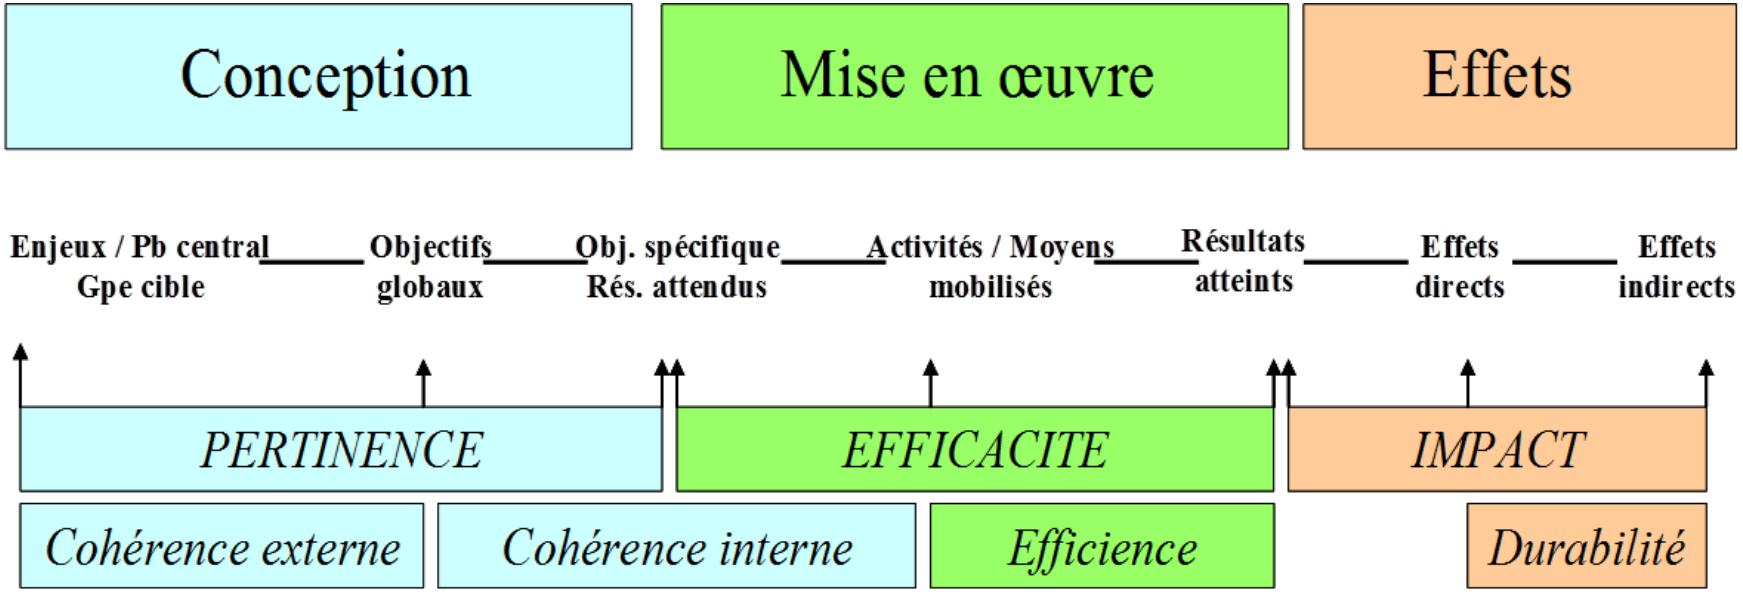

PHASE D'ACHEVEMENT

EVALUATION

Pertinence

En quoi objectifs et stratégie correspondent aux attentes des bénéficiaires / priorités pays / priorités globales y compris bailleurs ?

Quelle adéquation des objectifs avec :

1. **Le contexte socio économique et institutionnel du pays**
2. **La politique de développement du pays / ODD / stratégie bailleurs**
3. **Les besoins prioritaires des populations ciblées par le projet**

Questions évaluatives ? Sur …

- **Stratégie de ciblage du projet**
- **Prise en compte de l'environnement politique et institutionnel**
- **Degré de participation des acteurs y compris bénéficiaires au processus de conception du projet**
- **Montage institutionnel du projet et partenariats …**

EVALUATION

Cohérence

1 Cohérence interne = concordance entre moyens prévus et les objectifs / résultats attendus

Questions évaluatives ?

Interne

- Doubles emplois entre activités
- Les activités permettent d'atteindre les objectifs
- Contradiction entre différents niveaux d'objectifs

Externe

- Duplication avec d'autres interventions sur la même zone
- Complémentarités avec d'autres programmes
- Cohérence entre actions dans des domaines complémentaires (commerce / agriculture, éducation / agriculture , santé / agriculture …)

2 Cohérence externe = concordance avec les actions entreprises par les autres acteurs (bailleurs , Etat…)

EVALUATION

efficacité

Degré d'atteinte des objectifs, par comparaison entre les résultats obtenus (produits, effets directs, impact) et les résultats attendus (qualitatif et quantitatif)

1

Comparer :

- **activités prévues et réalisées / échéanciers**
- **Prévisions et réalisations budgétaires / échéanciers**
- **Résultats attendus et atteints**

2

Expliquer le niveau d'efficacité atteint (sur activités réalisées, budget, résultats)

3

Analyser :

- **l'efficacité du dispositif de gestion et d'appui du projet**
- **L'efficacité du système de suivi évaluation**

EVALUATION

Efficience

Economie des ressources utilisées pour l'atteinte des résultats.

1. **Comparer les résultats obtenus avec les moyens mis en œuvre (financiers , humains, …).**

2. **Déterminer si les ressources financières et humaines mobilisées pour le projet ont été utilisées de façon optimale et expliquer pourquoi et comment**

Questions évaluatives ?

- **Action économiquement rationnelle ?**
- **Rapport couts avantages des produits**
- **Mise à contribution d'autres ressources (acteurs de la région) ?**

EVALUATION

Durabilité

Continuité des bénéfices de l'action après la fin du projet : probabilité d'obtenir des bénéfices sur le long terme

1. **Sous quelles formes les résultats perdurent-ils après l'action pour les groupes cibles , les institutions partenaires et le pays / région concerné ?**
2. **Quels sont les facteurs de risques pour une durabilité à long terme des résultats ?**
3. **Dans quelle mesure les résultats de l'action peuvent ils être maintenus ?**

Questions évaluatives ?

- **Actions susceptibles de survivre au départ des moyens du projet**
- **Niveau d'implication des bénéficiaires et autres acteurs dans le maintien des activités**
- **Cofinancements pérennes**
- **Modèle économique retenu pour les actions et viabilité**

EVALUATION

impact

Au bout de la chaine de résultats

Niveau d'atteinte des objectifs visés et mesure des effets directs et induits (désirables ou non)

Porte sur les bénéficiaires finaux de l'intervention

Analyser tous les effets d'une action sur son environnement : technique, économique, social, écologique, institutionnel, politique…

1 **Comment l'action contribue –t-elle à la réalisation des objectifs. Dans quelle mesure l'action atteint-elle l'objectif initialement visé, et quelles sont les raisons majeures expliquant que cet objectif soit atteint ou non ?**

2 **À quels autres effets, transformations (positifs et négatifs) l'action contribue-telle ? Quelles retombées de large portée ont été induites ?**

Questions évaluatives ?

- **Liens entre intervention et changements observés**
- **Quelles sont les impacts de l'action sur les agriculteurs ? Sur les facteurs de production , sur les revenus , bien être …**
- **Qui a été impacté par l'action ? Directement, indirectement**
- **Quelle est la part de l'intervention dans les changements observés ?**
- **Pourquoi a-t-on obtenu cet impact ?**
- **Comment a-t-on obtenu cet impact ?**

PHASE D'ACHEVEMENT

Questionnement sur situation de référence , approche quantitative , qualitative …

Merci,

et A vous de jouer maintenant !

